프로젝트 명	Scent Seeker(센트 시커)
시작일	2024년 6월 31일
종료일	4조
작성일	2024년 7월 8일
버전	version 2
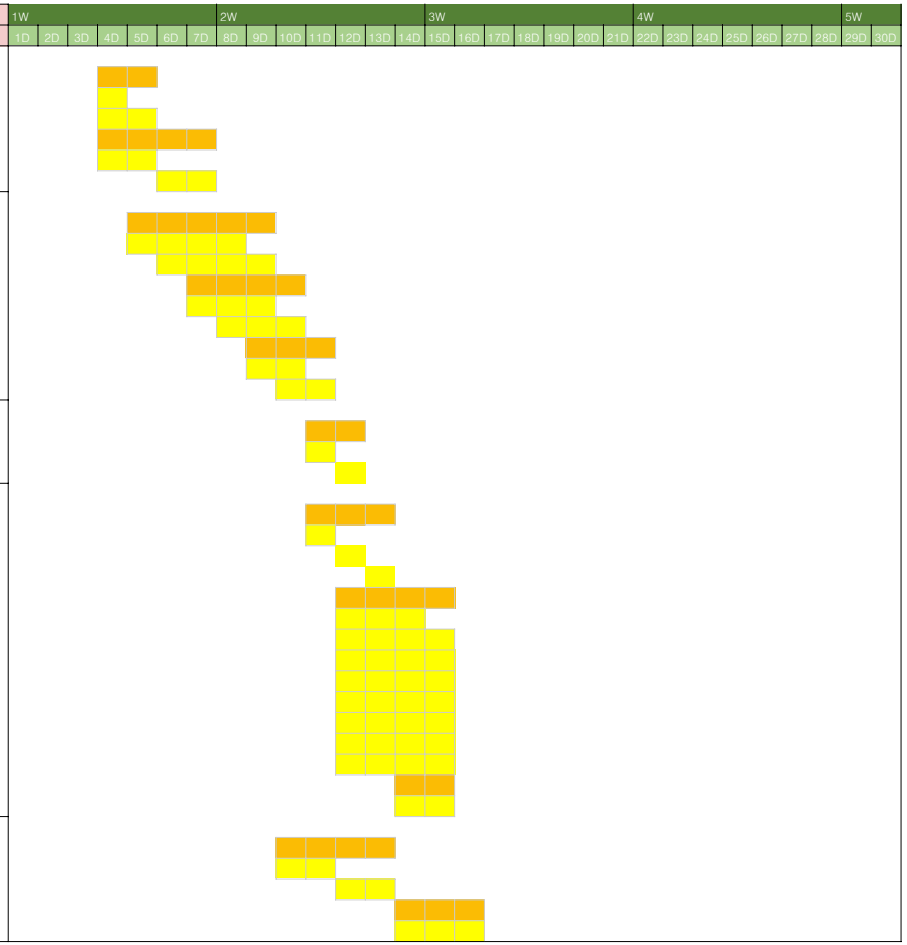
구분	주요 업무	세부 업무	상태	담당자	진척율	시작일	종료일	소요일
1. 기획								
	1.1 사전조사				100%	2024-06-27	2024-07-04	2
		1.1.1 주제 선정	완료	전원	100%	2024-06-27	2024-06-27	1
		1.1.2 시장 조사	완료	전원	100%	2024-06-27	2024-06-28	2
	1.2 요구사항 명세서 작성		완료		100%			4
		1.2.1. 1차 요구사항 명세서 작성	완료	전원	100%	2024-06-27	2024-06-28	2
		1.2.2. 2차 요구사항 명세서 작성	완료	전원	100%	2024-07-03	2024-07-04	2
2. 모델링								
	2.1 개념 모델링				100%			5
		2.1.1 1차 ERD 작성	완료	전원	100%	2024-06-28	2024-07-01	4
		2.1.2 2차 ERD 작성	완료	전원	100%	2024-06-29	2024-07-02	4
	2.2 논리 모델링							4
		2.2.1 1차 Barker 표기법 작성	완료	전원	100%	2024-06-30	2024-07-02	3
		2.2.2 2차 Barker 표기법 작성	완료	전원	100%	2024-07-01	2024-07-03	3
	2.3 물리 모델링				100%			3
		2.3.1 테이블 생성	완료	전원	100%	2024-07-02	2024-07-03	2
		2.3.2 제약조건 추가	완료	전원	100%	2024-07-03	2024-07-04	2
3. 개발								
	3.1 DB 서버 구축				100%			2
		3.1.1 네트워크 설정	완료	전원	100%	2024-07-04	2024-07-04	1
		3.1.2 master/slave 서버 구축	완료	전원	100%	2024-07-05	2024-07-05	1
4. 테스트								
	4.1 테스트케이스 작성				100%			3
		4.1.1 1차 테스트케이스 작성	완료	전원	100%	2024-07-04	2024-07-04	1
		4.1.2 2차 테스트케이스 작성	완료	전원	100%	2024-07-05	2024-07-05	1
		4.1.3 3차 테스트케이스 작성	완료	전원	100%	2024-07-06	2024-07-06	1
	4.2 테스트 데이터				100%			4
		4.2.1 테스트 데이터 입력	완료	전원	100%	2024-07-05	2024-07-07	3
		4.2.2 회원 테스트	완료	박경희	100%	2024-07-05	2024-07-08	4
		4.2.3 향수 탐색 테스트	완료	윤채연	100%	2024-07-05	2024-07-08	4
		4.2.4 향수 추천 테스트	완료	양현진	100%	2024-07-05	2024-07-08	4
		4.2.5 향수 상세정보 테스트	완료	노다민	100%	2024-07-05	2024-07-08	4
		4.2.6 리뷰 테스트	완료	김시우	100%	2024-07-05	2024-07-08	4
		4.2.7 커뮤니티 테스트	완료	장호정	100%	2024-07-05	2024-07-08	4
		4.2.8 신고 테스트	완료	김시우, 장호정	100%	2024-07-05	2024-07-08	4
	4.3 검증				100%			2
		4.3.1 검증하기	완료	전원	100%	2024-07-07	2024-07-08	2
5. 문서화								
	5.1 WBS 작성				100%			4
		5.1.1. 1차 WBS 작성	완료	전원	100%	2024-07-03	2024-07-04	2
		5.1.2. WBS 검토	완료	전원	100%	2024-07-05	2024-07-06	2
	5.2 Github				100%			3
		5.2.1 Readme 작성	완료	전원	100%	2024-07-07	2024-07-09	3
